

Praktijkexamen deel A: Schakelbericht IVWV **

Opdrachtnummer:

SB2* Voorbeeld

A: uit bedrijf nemen kabel tussen station LVK 2.1 en LVK 2.2

B: in bedrijf nemen motor M12 en kabel

Tijd : 60 minuten
Cesuur : 70%

Examen-instructies:

- Vermeld op het uniform schakelbericht de opdrachtomschrijving zoals hierboven is weergegeven.
- Vermeld uw naam op het uniform schakelbericht.
- U kunt het kladpapier van pagina 5 en pagina 6 gebruiken tijdens het examen. De hierop gemaakte aantekeningen worden niet gebruikt bij de beoordeling van uw examen.
- Lever alle documenten in na het voltooien van het examen.

Opdracht-instructies:

- Gebruik de eenlijnsschema's met de naam: Tekening LS 202210 die op pagina 3 en pagina 4 zijn weergegeven om het schakelbericht te schrijven.
- Gebruik voor iedere deelopdracht (Opdracht A en Opdracht B) de in TestVision aangegeven tabbladen.
- Het eenlijnsschema geeft de installatie in normaal bedrijf weer. De standaard netopeningen (NO) zijn weergegeven op het eenlijnsschema. Alle schakelaars die geen standaard netopeningen (NO) zijn, zijn in normaal bedrijf gesloten.
- **Let op!** De opdracht kan uitgaan van een afwijkende bedrijfsvoering. Als er sprake is van een afwijkende bedrijfsvoering is dit weergegeven in de status vooraf bij de Opdrachten A en/of B.
- De netopeningen zijn normale openingen met de juiste fase-volgorde en zonder fase-draaiingen.
- Alle afwijkende bedrijfsvoeringen moeten in de status achteraf worden weergegeven.

Opdracht A:

De kabel tussen **station LVK 2.1 en LVK 2.2** moet worden vervangen door een nieuwe kabel.

Het staat niet met zekerheid vast dat alle delen van de elektrische installatie waaraan gewerkt wordt spanningsloos blijven.

U neemt **de kabel** uit bedrijf. Er mag hierbij geen energieonderbreking plaatsvinden.

Schrijf een schakelbericht voor het uit bedrijf nemen van **de kabel**.

Gebruik hiervoor het in TestVision aangegeven tabblad Opdracht A

Opdracht B:

De voedingskabel van motor M12, van de verdeelinrichting naar de werkschakelaar, is vervangen door een nieuwe kabel.

De draairichting van de motor moet rechtsom zijn.

U neemt **motor M12** en **de kabel** in bedrijf.


Schrijf een schakelbericht voor het in bedrijf nemen van **motor M12** en **de kabel**.

De eindsituatie moet overeenkomen met de normale bedrijfsvoering volgens het eenlijnsschema.

Gebruik hiervoor het in TestVision aangegeven tabblad Opdracht B

Status vooraf opdracht B

Nr.	Spanning	Locatie	Veld	Status
1	LS	LVK 2.2	4	Uitgeschakeld, beveiligd tegen opnieuw inschakelen en bord of label geplaatst
2	LS	WS		Uitgeschakeld, beveiligd tegen opnieuw inschakelen en bord of label geplaatst

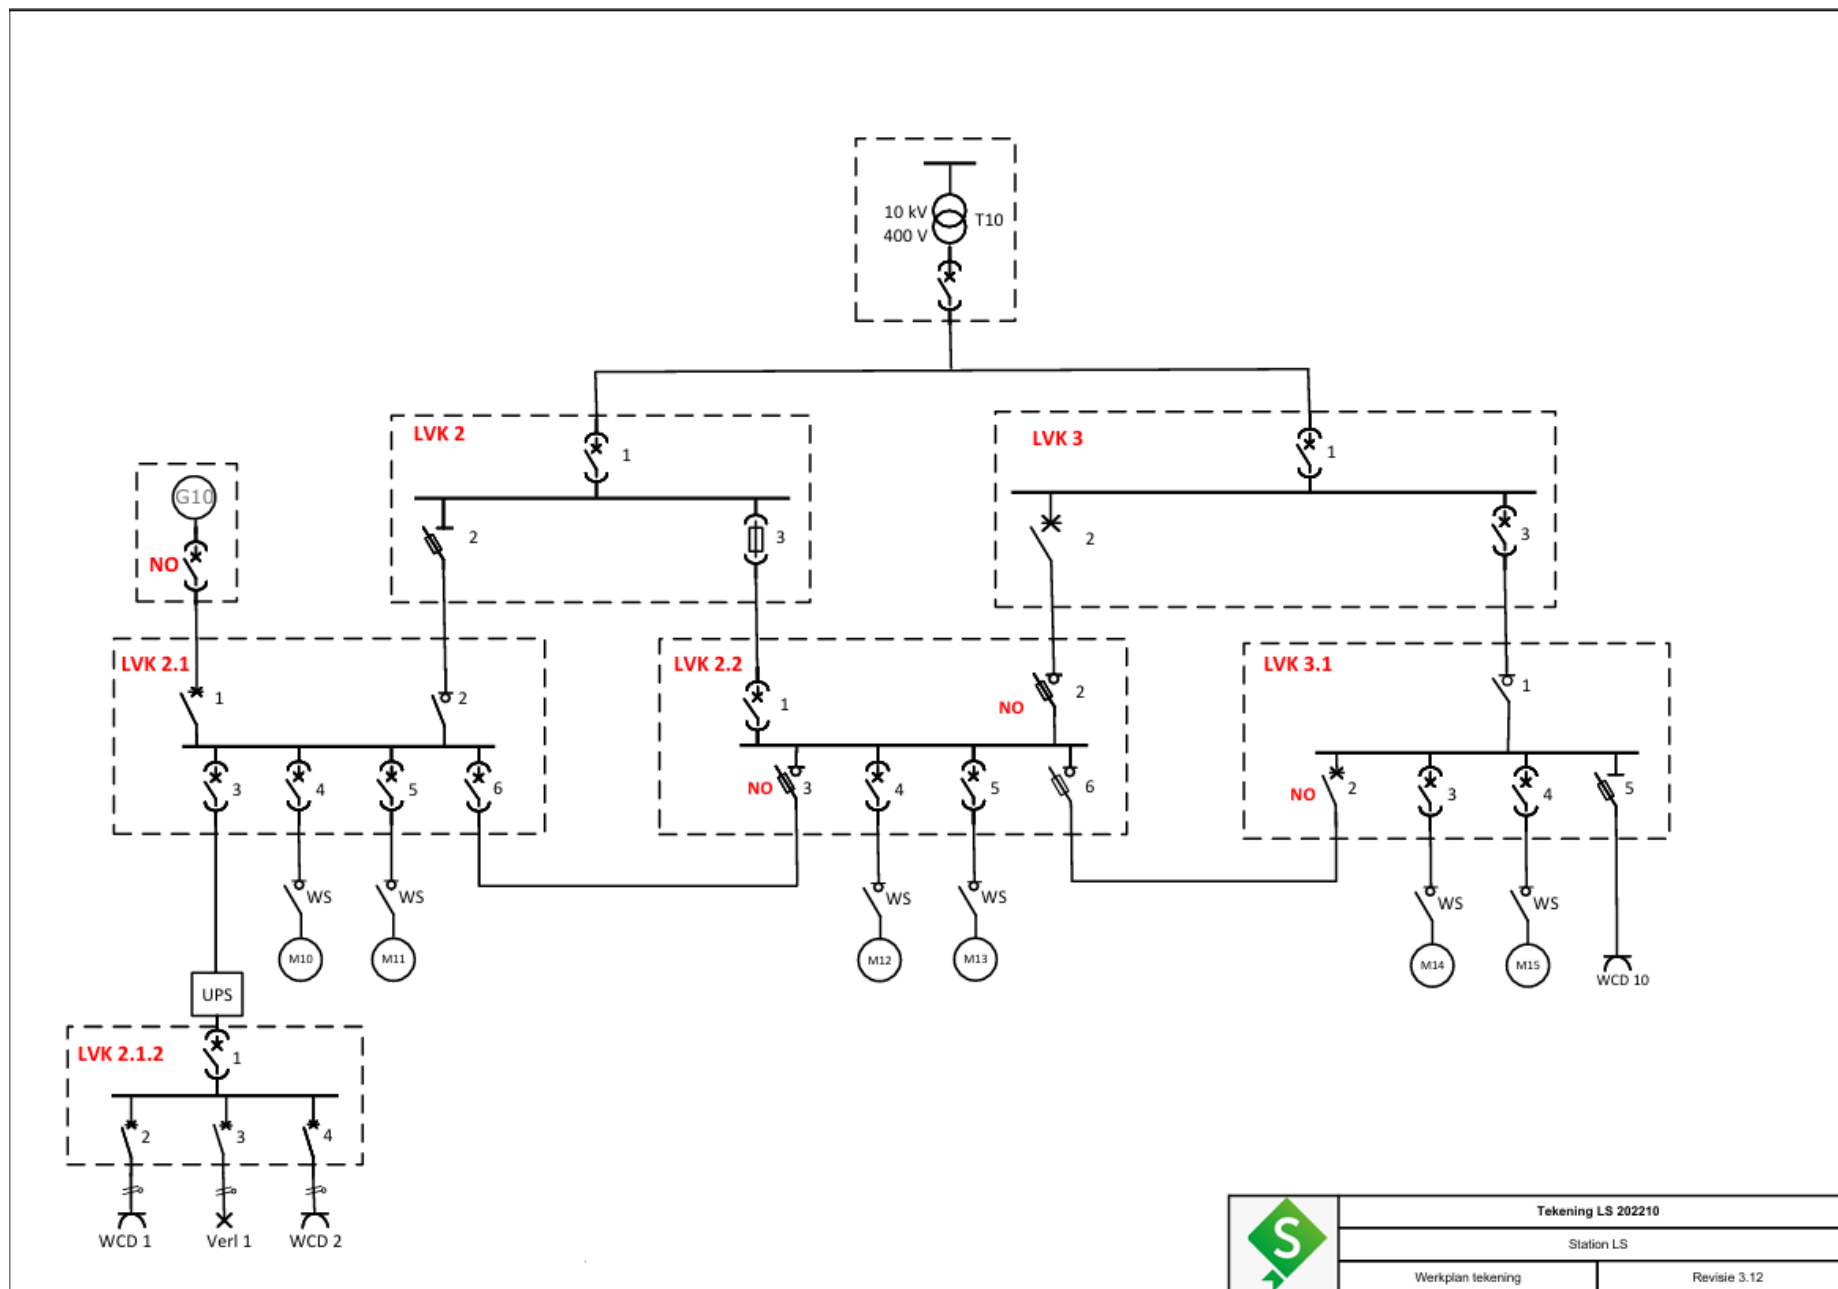



Kladpapier

De op dit kladpapier gemaakte aantekeningen worden niet meegenomen bij de beoordeling. Na het maken van het examen moet dit kladpapier echter wel worden ingeleverd.

Nr.	Locatie	Spanning	Veld	Richting	Handelingen
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

Status achteraf				
Nr.	Locatie	Spanning	Veld	Status
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
